



Municipalidad de **La Molina**

#SucedaLoQueSuceda

LA MOLINA
Se Renueva



SITUACIÓN DE LAS INVERSIONES PRIORIZADAS DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023



UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES *SUBGERENCIA DE ECOLOGIA Y OPERACIONES AMBIENTALES*

1. AMPLIACIÓN DE LA RED DE CANALES DE REGADÍO DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA – ETAPA 2.
2. ADQUISICIÓN DE ELEVADOR DE PLATAFORMA; EN EL (LA) SUBGERENCIA DE ECOLOGÍA Y ORNATO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA EN LA LOCALIDAD LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA.



TALLER DE RENDICIÓN DE CUENTAS - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026

AMPLIACIÓN DE LA RED DE CANALES DE REGADÍO DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA – ETAPA 2.

CUI: 2511868

MONTO APROBADO PP 2023: S/ 752,043.20 ↓

OBJETIVOS:

El objetivo central del presente proyecto consiste en contar con canales de regadío para abastecer de agua a los parques:

- PARQUE MELVIN JONES
- PARQUE AMISTAD PERU TAIPE

LOGROS CUALITATIVOS:

Lograr aprovechar la existencia de dicho canal para mejorar el sistema de regadío de los parques de la zona norte que actualmente se riegan con agua potable.

METAS CUANTITATIVAS:

- Uso del agua de canal de regadío para una extensión de: 20,272.89 m² de área verde, abastecimiento permanente y en mayor cantidad.
- Reducir el alto gasto por uso de agua potable para el riego de estos dos parques



#SucedaLoQueSuceda

LA MOLINA
Se Renueva



TALLER DE RENDICIÓN DE CUENTAS - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026

OBRA EJECUTADA:
INICIO DE OBRA: 15/07/2024



7 ago. 2024 3:48:36 p. m.
280 Los Datileros
Provincia de Lima



#SucedaLoQueSuceda

LA MOLINA
Se Renueva



TALLER DE RENDICIÓN DE CUENTAS - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026



28 ago. 2024 4:35:32 p. m.
258 Los Datileros
La Molina
Provincia de Lima

#SucedaLoQueSuceda

LA MOLINA
Se Renueva



TALLER DE RENDICIÓN DE CUENTAS - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026

OBRA EJECUTADA:

FIN DE OBRA: 12/10/2024



#SucedaLoQueSuceda

LA MOLINA
Se Renueva



TALLER DE RENDICIÓN DE CUENTAS - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026





#SucedaLoQueSuceda

LA MOLINA
Se Renueva



TALLER DE RENDICIÓN DE CUENTAS - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026

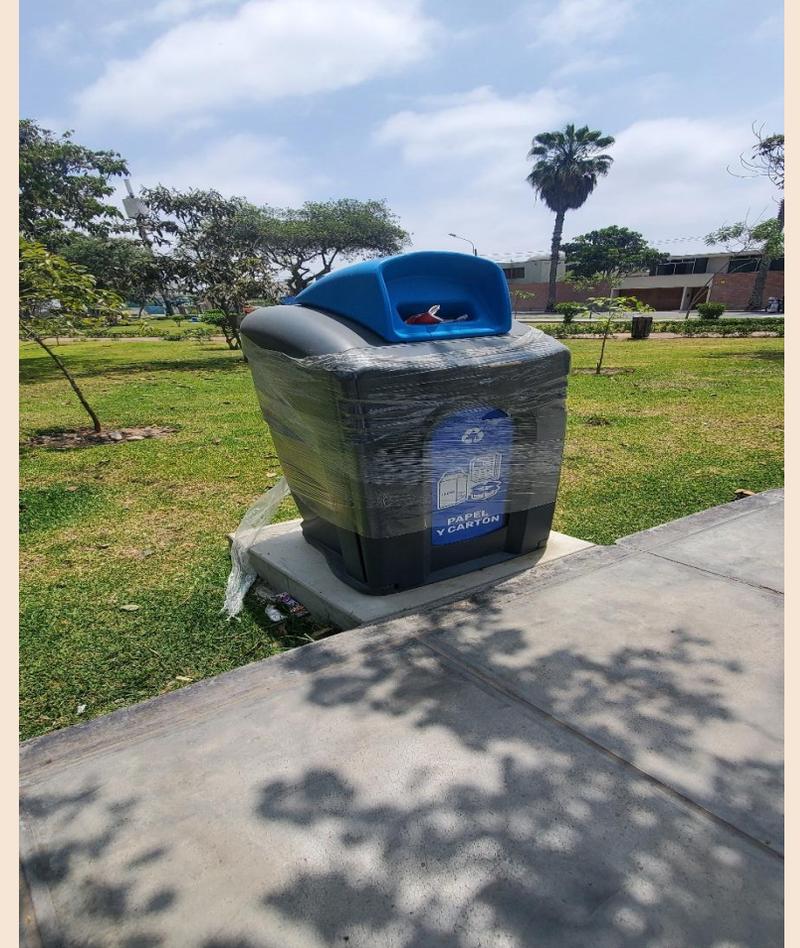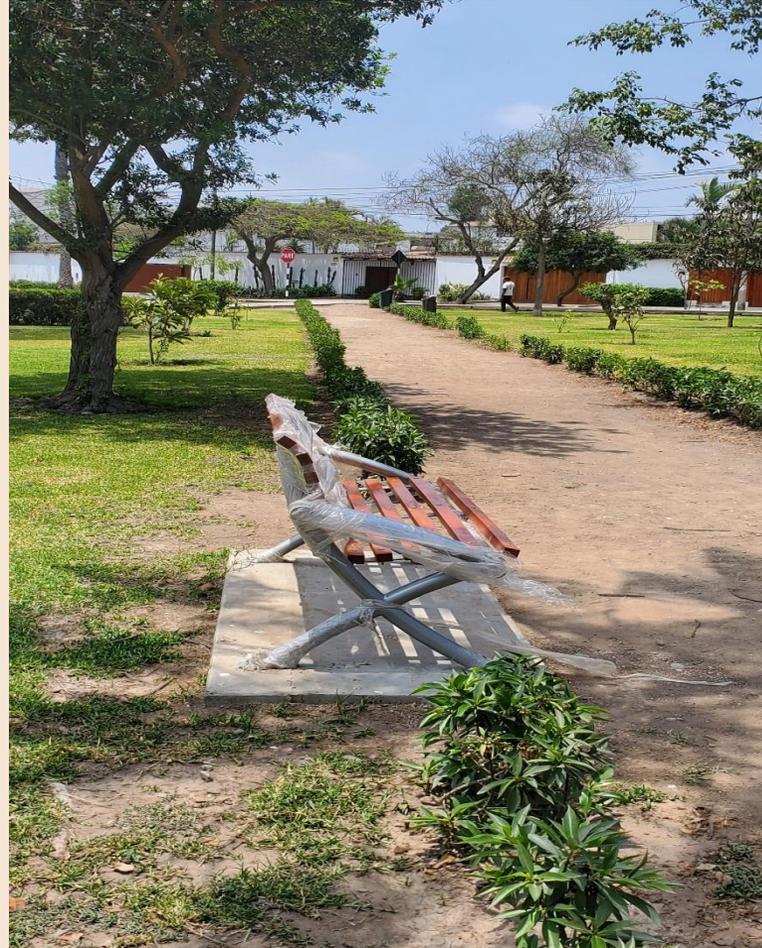

#SucedaLoQueSuceda

LA MOLINA
Se Renueva



TALLER DE RENDICIÓN DE CUENTAS - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026



Parque Amistad Perú
Taipéi de la Urb.
Res. Monterrico

Parque Melvin
Jones de la Urb.
Sta. Patricia



#SucedaLoQueSuceda

LA MOLINA
Se Renueva



TALLER DE RENDICIÓN DE CUENTAS - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026

ADQUISICIÓN DE ELEVADOR DE PLATAFORMA; EN EL (LA) SUBGERENCIA DE ECOLOGÍA Y ORNATO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA EN LA LOCALIDAD LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA.

CUI: 2593968

MONTO APROBADO PP 2023: S/ 390,000.00 ↑

La Subgerencia de Ecología y Operaciones Ambientales, encargada de la Unidad Ejecutora de Inversiones concluyó con la elaboración del Documento Equivalente de este proyecto que ya cuenta con Resolución de Aprobación.

Con el apoyo de la Oficina de Abastecimiento se realizó la contratación de una empresa especializada en la venta de vehículos tipo camión con elevador de plataforma.

OBJETIVO: Que el distrito de la Molina cuente con una unidad vehicular debidamente equipada para el apoyo en las labores de poda de árboles, en especial de los de gran altura. Con ello se logrará tener un control del crecimiento de las especies arbóreas sin afectar a la población.

#SucedaLoQueSuceda

LA MOLINA
Se Renueva



TALLER DE RENDICIÓN DE CUENTAS - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026

INVERSION IOARR CONCLUIDA: 09/2024



#SucedaLoQueSuceda

LA MOLINA
Se Renueva



TALLER DE RENDICIÓN DE CUENTAS - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026



#SucedaLoQueSuceda

LA MOLINA
Se Renueva



SITUACIÓN DE LAS INVERSIONES PRIORIZADAS DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024



TALLER DE RENDICIÓN DE CUENTAS - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PP) 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO DE FINANCIAMIENTO	MONTO S/
05. Recursos Determinados	07. Fondo de compensación Municipal - Foncomun	500,000.00

INVERSIONES PRIORIZADAS PARA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PP) 2024

N°	NOMBRE DE LA INVERSIÓN
1	ADQUISICIÓN DE MAQUINAS CHIPEADORAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE RECOJO, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDIOS VEGETALES TIPO MALEZA
2	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y OPTIMIZZACIÓN DE EQUIPOS TEWCNOLOGICOS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA- DEPARTAMENTO DE LIMA-PROVINCIA DE LIMA

#SucedaLoQueSuceda



UNIDAD EJECUTORA
SUBGERENCIA DE ECOLOGÍA Y OPERACIONES AMBIENTALES

1. OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DE LA ADQUISICION DE CHIPEADORAS PARA EL SECTOR 2 DEL DISTRITO DE LA MOLINA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA



TALLER DE RENDICIÓN DE CUENTAS - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026

ADQUISICIÓN DE TRITURADOR DE RESIDUOS; EN EL (LA) SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA PARA LA SUBGERENCIA DE ECOLOGÍA, ORNATO Y OPERACIONES AMBIENTALES DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA

Código de Único:

2646657

Costo E.T.

S/ 274,488.00 ↑



Imagen referencial

Cronograma

Etapa	Fecha Inicio	Fecha Fin
Convocatoria	07/04/2025	07/04/2025
Registro de participantes(Electronica)	08/04/2025 00:01	20/04/2025 23:59
Formulación de consultas y observaciones(Electronica)	08/04/2025 00:01	09/04/2025 23:59
Absolución de consultas y observaciones(Electronica)	14/04/2025	14/04/2025
Integración de las Bases a través del SEACE	14/04/2025	14/04/2025
Presentación de ofertas(Electronica)	21/04/2025 00:01	21/04/2025 23:59
Evaluación y calificación Ofc. de Abastecimiento	22/04/2025	22/04/2025
Otorgamiento de la Buena Pro a través del SEACE	22/04/2025 08:30	22/04/2025

#SucedaLoQueSuceda

LA MOLINA
Se Renueva



TALLER DE RENDICIÓN DE CUENTAS - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026

ADQUISICIÓN DE TRITURADOR DE RESIDUOS; EN EL (LA) SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA PARA LA SUBGERENCIA DE ECOLOGÍA, ORNATO Y OPERACIONES AMBIENTALES DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA



#SucedaLoQueSuceda

LA MOLINA
Se Renueva



SITUACIÓN DE LAS INVERSIONES PRIORIZADAS DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025



INVERSIONES PRIORIZADAS PARA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PP) 2025

N°	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	
1	MEJORAMIENTO DE PARQUES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA: PARQUE BARBARA D'ACHILLE, PARQUE DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA MUSA, PARQUE JOSE RIZAL, PARQUE KOHATZU Y PARQUE VALLADOLID	



TALLER DE RENDICIÓN DE CUENTAS - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026

Estas inversiones han sido declaradas viables por la Unidad Formuladora de la Subgerencia de Gestión de Inversiones y cuentan con Código Único de Inversiones con un presupuesto preliminar:

- ❖ RENOVACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) PARQUE KOHATSU - URB. INGENIEROS, CON ADQUISICION DE MOBILIARIO: BANCA , JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS, EQUIPOS DE GIMNASIO, LUMINARIAS, PAPELERAS Y OTROS ; EN EL CENTRO POBLADO LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA – CUI N° 2658105
- ❖ RENOVACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) PARQUE DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA COOPERATIVA IV ETAPA MUSA EN EL CENTRO POBLADO LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA – CUI N° 2655416
- ❖ RENOVACION DE CAMPO MENOR (MULTIDEPORTIVO RECREATIVO); EN EL(LA) PARQUE VALLADOLID DE LA URB. LAS LOMAS DE LA MOLINA VIEJA DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA – CUI N° 2661619
- ❖ RENOVACION DE AREA VERDE; ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS Y LUMINARIA; CONSTRUCCION DE SENDERO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE BARBARA D'ACHILLE EN EL CENTRO POBLADO LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - CUI N° 2672084

#SucedaLoQueSuceda

LA MOLINA
Se Renueva



TALLER DE RENDICIÓN DE CUENTAS - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026

Estas inversiones a la fecha cuentan con Expediente Técnico aprobado por la Unidad Ejecutora de Inversiones de la Subgerencia de Ecología y Operaciones Ambientales.

- ❖ RENOVACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) PARQUE KOHATSU - URB. INGENIEROS, CON ADQUISICION DE MOBILIARIO: BANCA , JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS, EQUIPOS DE GIMNASIO, LUMINARIAS, PAPELERAS Y OTROS ; EN EL CENTRO POBLADO LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA – CUI N° 2658105
- ❖ RENOVACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) PARQUE DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA COOPERATIVA IV ETAPA MUSA EN EL CENTRO POBLADO LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA – CUI N° 2655416
- ❖ RENOVACION DE CAMPO MENOR (MULTIDEPORTIVO RECREATIVO); EN EL(LA) PARQUE VALLADOLID DE LA URB. LAS LOMAS DE LA MOLINA VIEJA DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA – CUI N° 2661619

#SucedaLoQueSuceda

LA MOLINA
Se Renueva




TALLER DE RENDICIÓN DE CUENTAS - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026

Estas inversiones pasarán por un proceso de actualización de los costes sin afectar las componentes declaradas viables por la Unidad Formuladora de Inversiones de la Subgerencia de Gestión de Inversiones



Imágenes referenciales



#SucedaLoQueSuceda


LA MOLINA
Se Renueva

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!



Municipalidad de
La Molina

LA MOLINA
Se Renueva



Municipalidad de
La Molina

RENDICIÓN DE CUENTAS - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - 2024

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA




Municipalidad de
La Molina

Abril 2025

LA MOLINA
Se Renueva



SMART CITY

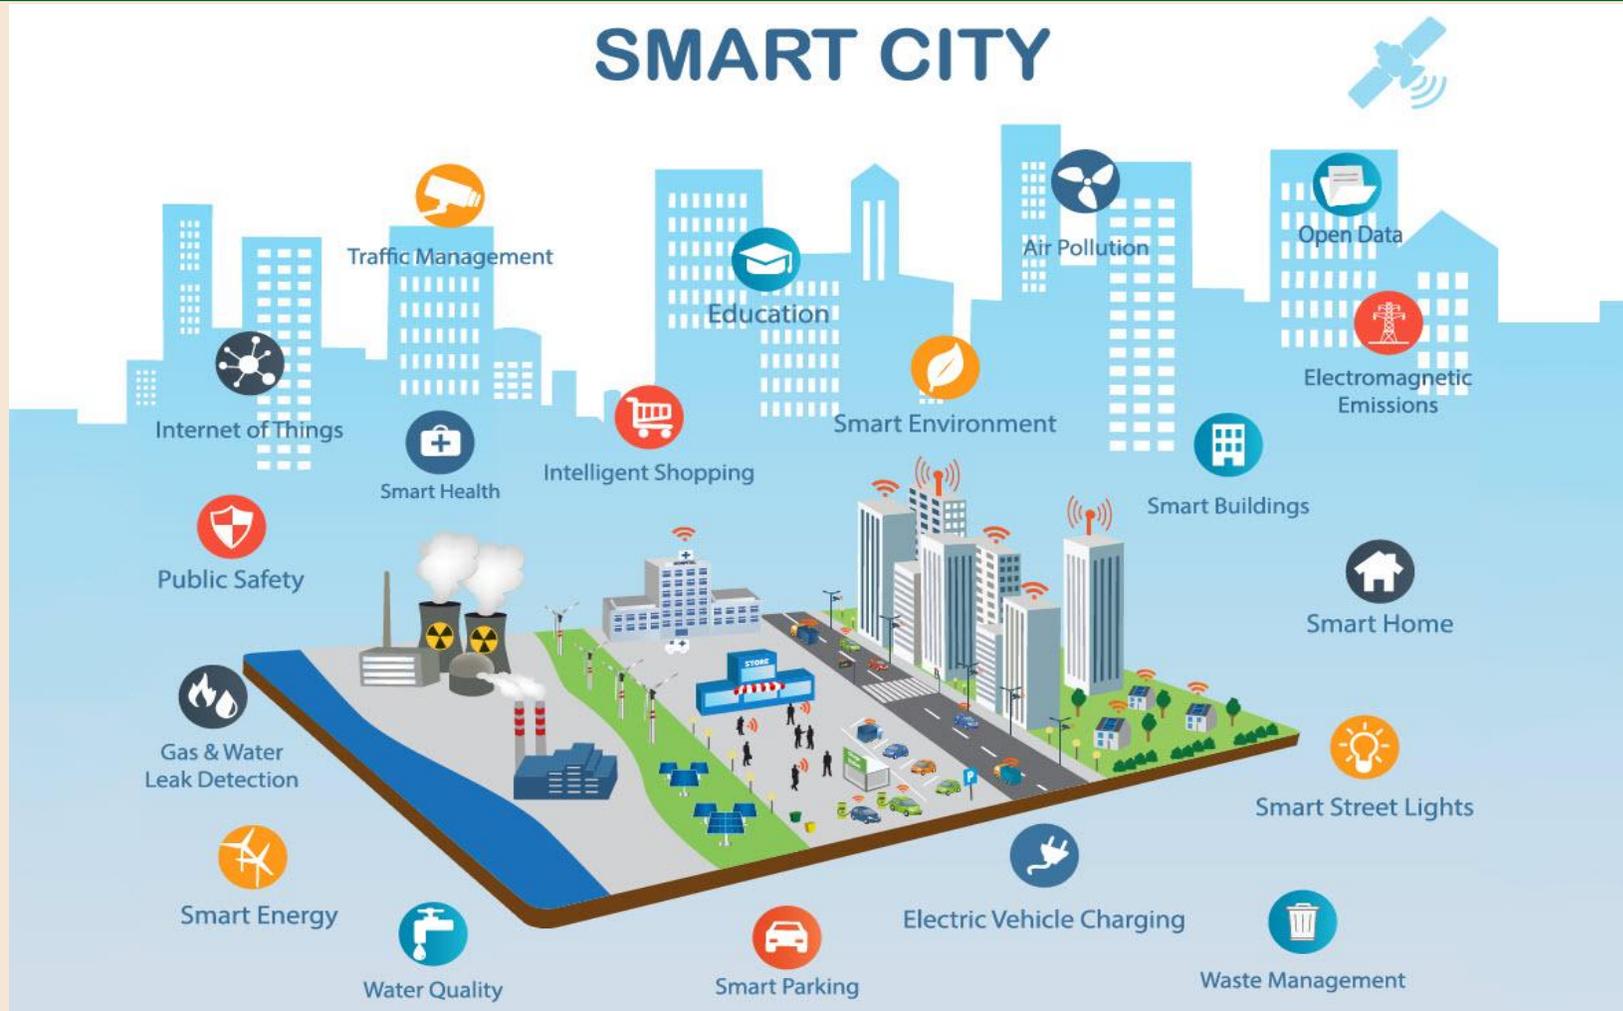


#SucedaLoQueSuceda

LA MOLINA
Se Renueva



Agenda

- 2655684 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA.
- 2597974 ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CAMARA DE CONTROL, CAMARA GRABADORA O VIDEO CAMARA Y CAMARA DIGITAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CENTRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (CSI) EN LA LOCALIDAD LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA.





2655684

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

Objetivo General:

Mejorar y ampliar el servicio de seguridad ciudadana local en La Molina mediante la implementación de infraestructura, tecnología y recursos humanos que fortalezcan la prevención del delito y la atención oportuna a emergencias.

Objetivo Específico:

- Fortalecer la capacidad operativa del serenazgo mediante el equipamiento tecnológico moderno.
- Ampliar la cobertura de videovigilancia en zonas críticas (puntos ciegos) del distrito.
- Optimizar el tiempo de respuesta ante incidentes mediante el uso de sistemas de geolocalización y comunicación.
- Incrementar la percepción de seguridad en la población a través de campañas de prevención y participación ciudadana.





2655684

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

Componente 1: Equipamiento electrónicamente activo para CCTV.	
Equipamiento	Cantidad
Video cámaras	200
Dron	1
Componente 02: Equipamiento de estructuras para CCTV en seguridad ciudadana	200
Componente 03: Almacenamiento y software de video cámaras en seguridad ciudadana	200
Componente 04: Servicios de implementación de video cámaras para seguridad ciudadana	200
Componente 05: Equipamiento móvil para mantenimiento de sistema de video cámaras Unidad Móvil con sistema hidroelevado con canastilla con protección de 15 metros	1
Componente 06: Equipamiento de protección eléctrica para sistemas de video cámaras - Grupo Electrógenos	2
Componente 07: Sistema de visualización led: Licenciamiento, software base y Licencia gestión de contenido.	2

COSTO TOTAL DE LA
INVERSIÓN**S/ 4,707,055**

#SucedaLoQueSuceda

LA MOLINA
Se Renueva




2655684

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

FIBRA ÓPTICA

PROYECTADO

90 KM

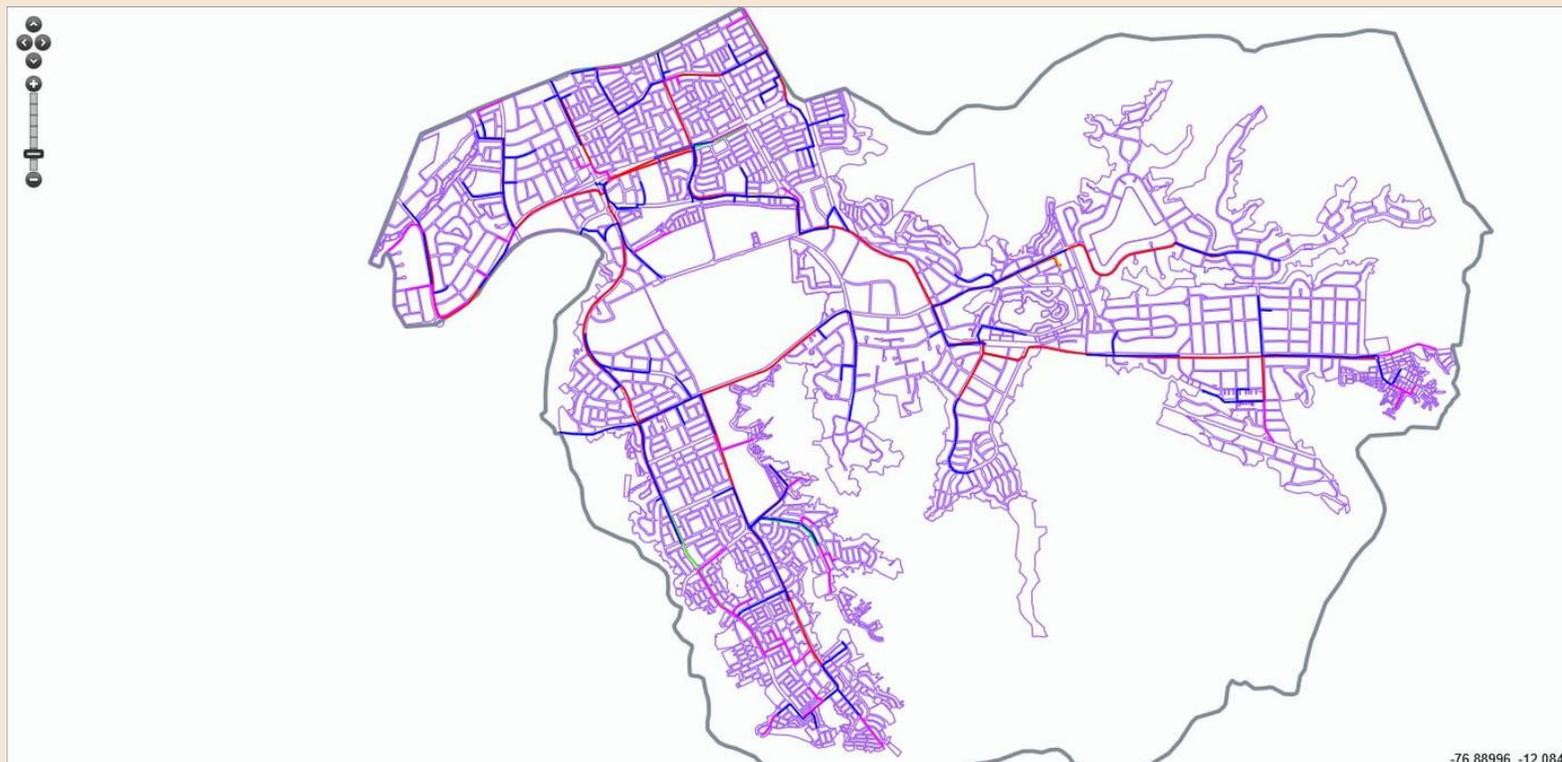

Fuente: Elaboración propia




2655684

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

CAMARAS

PROYECTADO

206 CAMARAS

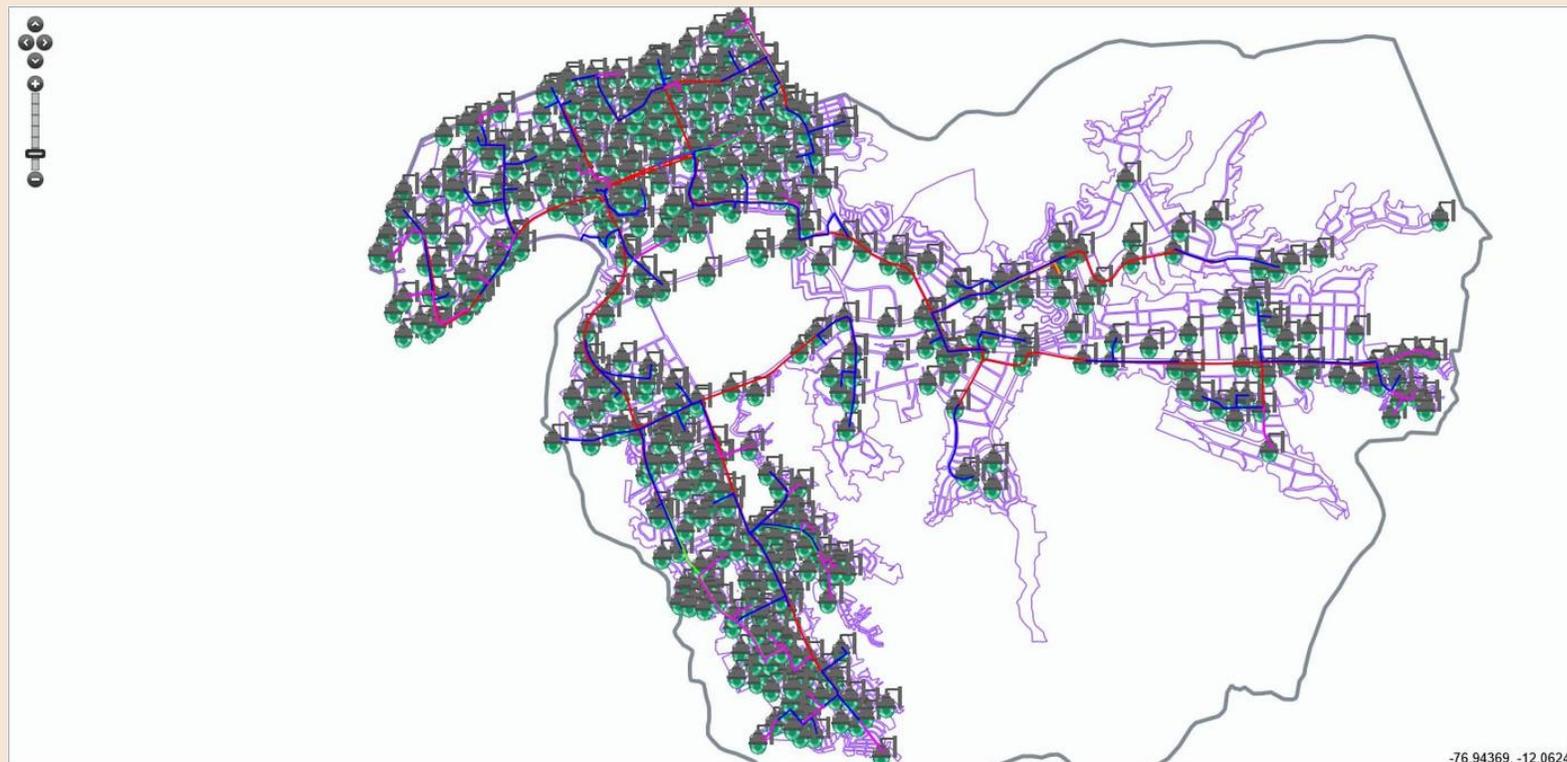

Fuente: Elaboración propia



2597974

ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CAMARA DE CONTROL, CAMARA GRABADORA O VIDEO CAMARA Y CAMARA DIGITAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CENTRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (CSI) EN LA LOCALIDAD LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA.

Objetivo General:

Fortalecer la operatividad de la Central de Gestión de Seguridad en La Molina mediante la adquisición de equipos tecnológicos y activos que mejoren la vigilancia, control y respuesta ante incidentes.

Objetivo Específico:

- Incorporar un sistema de video wall gestionado para el mejoramiento de la visualización y seguimiento de objetivos.
- Mejorar la capacidad de almacenamiento y análisis de imágenes y videos mediante tecnología actualizada para reforzar la seguridad ciudadana.
- Equipar al CGS con otros activos necesarios que garanticen la continuidad operativa y una respuesta eficiente ante situaciones de riesgo o emergencia.
- Adquirir equipos de aire acondicionado que mantengan condiciones ambientales óptimas para la conservación de equipamiento tecnológico.





2597974

ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CAMARA DE CONTROL, CAMARA GRABADORA O VIDEO CAMARA Y CAMARA DIGITAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CENTRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (CSI) EN LA LOCALIDAD LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA.

Ejecutado: S/. 1 383 050.00 2024


COMPONENTES
SERVIDOR DE GRABACION DE VIDEO
CAMARA DE CONTROL
CAMARA GRABADORA O VIDEO CAMARA
CAMARA DIGITAL
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
SWITCH

4. EJECUCIÓN FINANCIERA


AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DE LA INVERSIÓN

COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO:	S/ 4,984,976
DEVENGADO ACUMULADO:	S/ 1,383,050
PRIMER DEVENGADO:	SET-2024
ULTIMO DEVENGADO:	DIC-2024

% DE AVANCE ACUMULADO



HISTÓRICO DEL DEVENGADO DE LA INVERSIÓN (S/ MM)

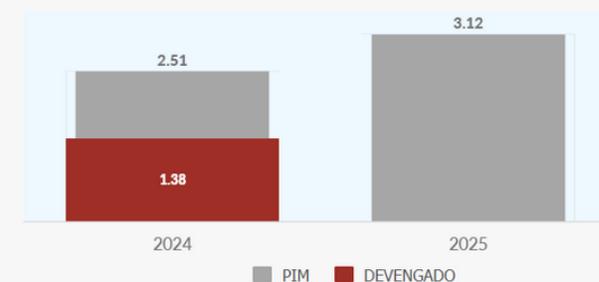



2597974

ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CAMARA DE CONTROL, CAMARA GRABADORA O VIDEO CAMARA Y CAMARA DIGITAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CENTRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (CSI) EN LA LOCALIDAD LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA.

VIDEOWALL: Sistema de Videovigilancia y Monitoreo de Alta Tecnología.

La OTIE adquirió el primer videowall 4K en Perú (9x3.5 m) con un gestor autónomo, que permite la visualización de objetivos mediante reconocimiento facial y de placas. Esta tecnología refuerza la visión de Smart City, optimizando la detección de incidentes y mejorando la respuesta ante emergencias en el distrito.




#SucedaLoQueSuceda

LA MOLINA
Se Renueva



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!



Municipalidad de
La Molina

ESTADO SITUACIONAL

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

SUBGERENCIA GESTION DE INVERSIONES



Municipalidad de
La Molina

LA MOLINA
Se Renueva



PROYECTOS CONSIDERADOS PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

1. “CONSTRUCCION DE SENDERO, ANFITEATRO Y ZONA DE ESTACIONAMIENTO; ADQUISICION DE SEÑALES DE TRAFICO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EL(LA) HUACA MELGAREJO DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” CUI N° 2627239 - DESACTIVADO

“CONSTRUCCION DE SENDERO, CENTRO DE INTERPRETACION, ZONA DE ESTACIONAMIENTO PARA USO TURISTICO Y OFICINA Y/O CASETA DE INFORMACION TURISTICA; EN EL(LA) HUACA MELGAREJO DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” CUI N° 2678525

EL CUAL CONTIENE ENTRE SUS CARACTERISTICAS INTERVENCIONES ENMARCADOS EN EL SECTOR TURISMO:

AUMENTAR EL NIVEL DE CALIDAD DEL SERVICIO OFRECIDO

AUMENTAR EN NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS QUE PERMITAN OPTIMIZAR LA EXPERIENCIA TURÍSTICA AL PROPORCIONAR UN ESPACIO ADECUADO PARA LA DIFUSIÓN DE SU VALOR ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO Y CULTURAL.



AREA DE INTERVENCION






PROYECTOS EN LA HUACA MELGAREJO

2. “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL EN EL MONUMENTO ARQUEOLOGICO PREHISPANICO HUACA MELGAREJO DE CENTRO POBLADO LA MOLINA DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI N° 2662124

OBJETIVO DEL PROYECTO

El Proyecto tiene como objetivo; mejorar los servicios de interpretación cultural en el bien inmueble prehispánico Huaca Melgarejo; mediante los trabajos de investigación, conservación, acondicionamiento cultural y difusión para el uso social que promueva la identidad cultural en el distrito.



AREA DE INTERVENCION





INTERVENCIONES

ESTADO ACTUAL
PARQUE HISPANOAMERICA



PROPUESTA
PARQUE HISPANOAMERICA



“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL EN EL MONUMENTO ARQUEOLÓGICO PREHISPÁNICO HUACA MELGAREJO DE CENTRO POBLADO LA MOLINA DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI N° 2662124

“CONSTRUCCIÓN DE SENDERO, CENTRO DE INTERPRETACION, ZONA DE ESTACIONAMIENTO PARA USO TURÍSTICO Y OFICINA Y/O CASETA DE INFORMACION TURÍSTICA; EN EL(LA) EL(LA) HUACA MELGAREJO DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” CUI N° 2678525.

#SucedaLoQueSuceda

LA MOLINA
Se Renueva



LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO



SE A REALIZADO EL
LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO DE LA ZONA A
INTERVENIR:


- HUACA MELGAREJO
- PARQUE HISPANOAMERICA.

#SucedaLoQueSuceda

LA MOLINA
Se Renueva



LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

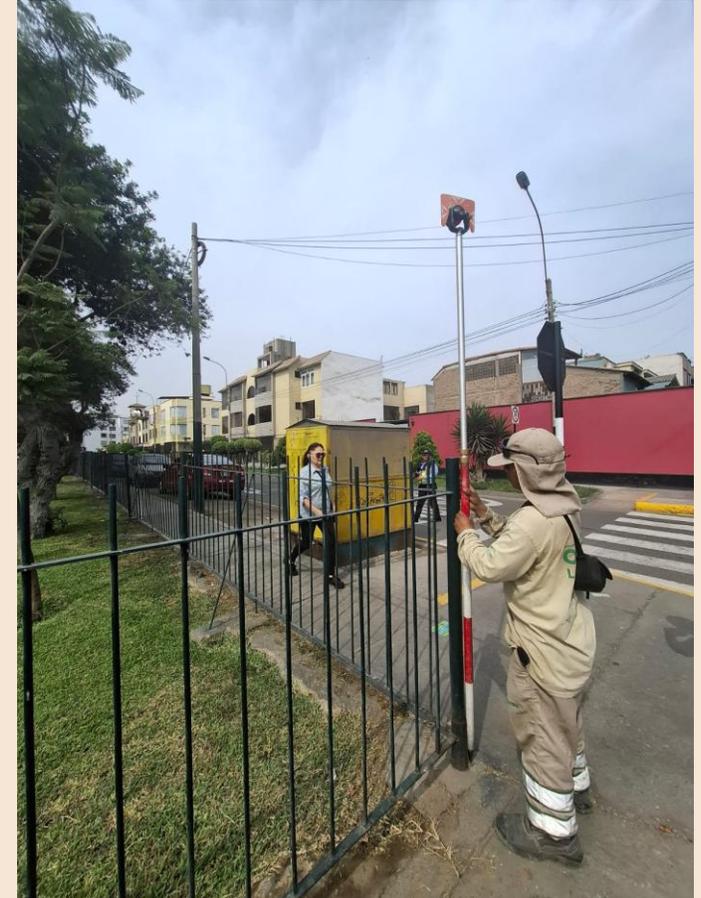


#SucedaLoQueSuceda

LA MOLINA
Se Renueva



PLANO TOPOGRAFICO

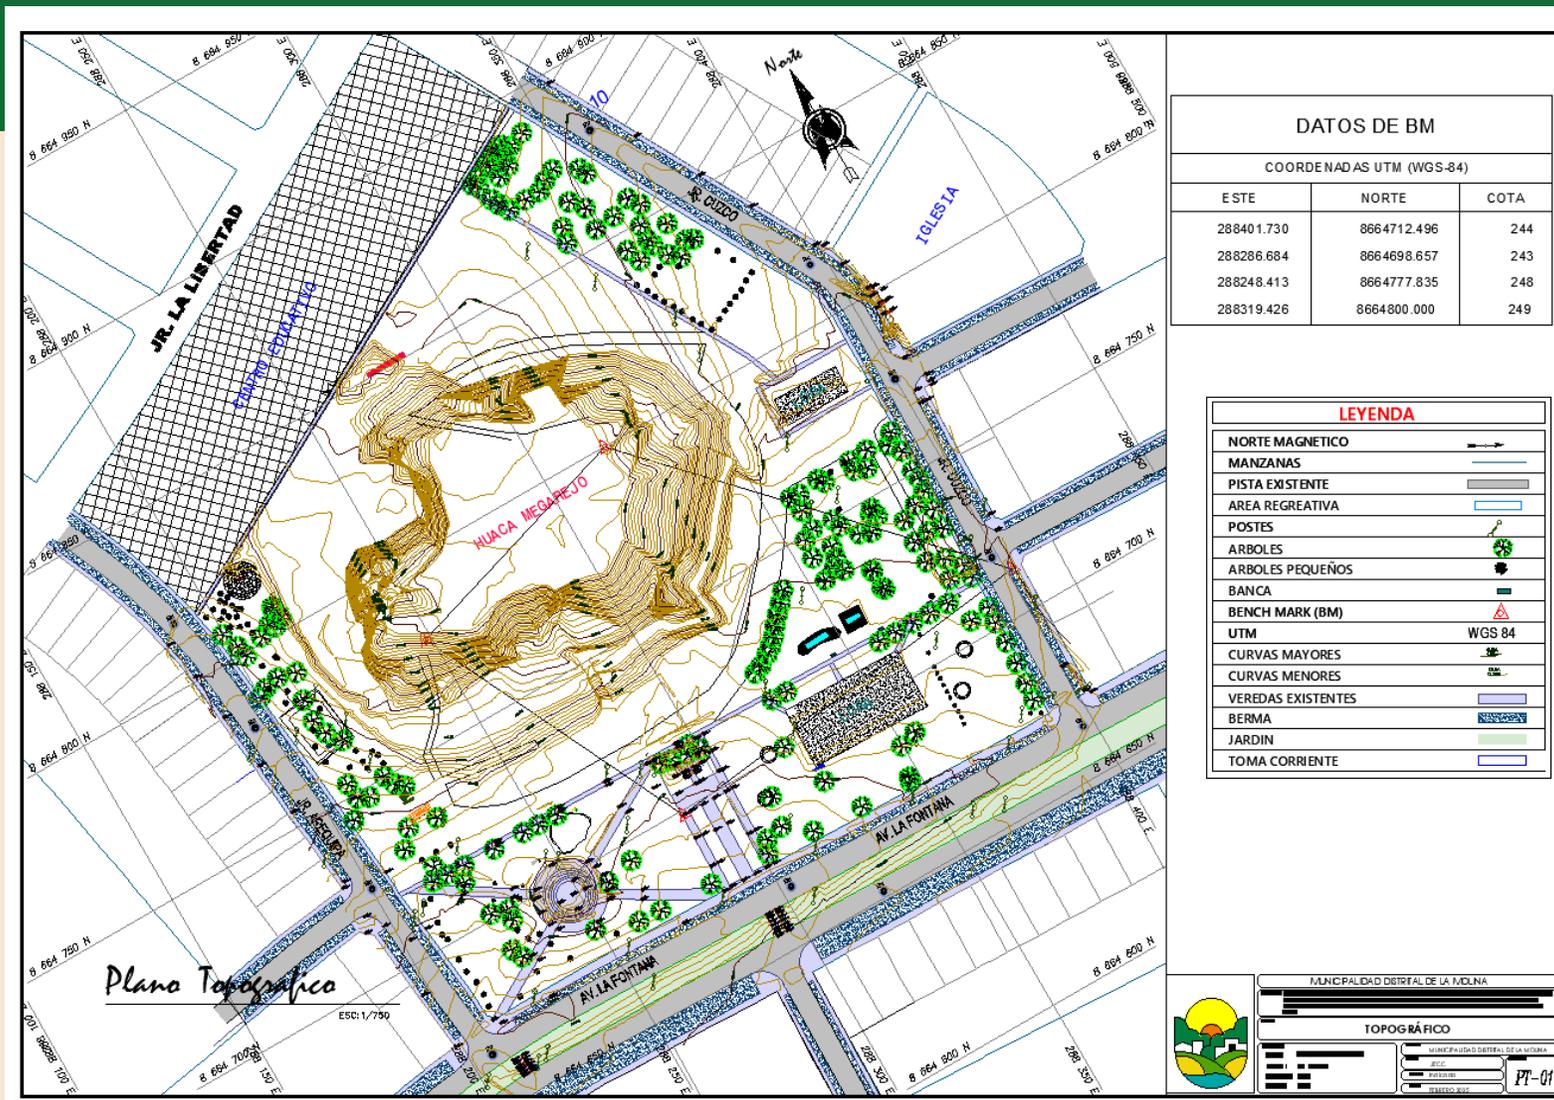

#SucedaLoQueSuceda

LA MOLINA
Se Renueva



▶▶▶ AVANCES

A LA FECHA SE REALIZARON LAS SIGUEINTES GESTIONES CON MINISTERIO DE CULTURA

A LAS CUALES SE LES A SOLICITADO LO SIGUIENTE:

1. DELIMITACION Y GEOREFERENCIACIÓN DE LA POLIGONAL DEL SITIO ARQUEOLÓGICO HUACA MELGAREJO Y SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL SITIO ARQUEOLÓGICO HUACA MELGAREJO **(OFICIO N° 0004-2025-MDLM-GDU-SGI)**.
 - 1.1. RESPUESTA CON OFICIO N° 000378-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC/MC, DEL 19.03.2025; DE LA DIRECCION DE CATASTRO Y SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL, QUE REMITE PLANO DE DELIMITACIÓN Y SANEAMIENTO FISICO LEGAL.
1. ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE MONUMENTOS PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO **(OFICIO N° 0005-2025-MDLM-GDU-SGI)**.
 - 2.1. RESPUESTA CON OFICIO N° 000034-2025-DMO-DGPA-VMPCIC/MC – BRINDA ASISTENCIA TECNICA, NOMBRANDO A LA LIC. GIOVANNA BRAVO CASTILLO.



#SucedaLoQueSuceda

LA MOLINA
Se Renueva



▶▶▶ AVANCES

A LA FECHA NOS ENCONTRAMOS A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DE LAS UNIDADES ORGANICAS: MINCETUR Y EL MINISTERIO DE CULTURA A LAS CUALES SE LES A SOLICITADO LO SIGUIENTE:

- ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE PRODUCTOS Y DESTINOS TURÍSTICOS CON EL OBJETIVO DE GESTIONAR EL FINANCIAMIENTO MEDIANTE EL **PLAN COPESCO NACIONAL. (OFICIO N° 0007-2025-MDLM-GDU-SGI).**
- LA INCORPORACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS EN EL LISTADO DE CIERRE DE BRECHAS DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO (MINCETUR) **(OFICIO N° 0008-2025-MDLM-GDU-SGI).**



#SucedaLoQueSuceda

LA MOLINA
Se Renueva



CUI 2662124: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL EN EL MONUMENTO ARQUEOLOGICO PREHISPANICO HUACA MELGAREJO DE CENTRO POBLADO LA MOLINA DISTRITO DE LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"

Indique monto actualizado a la fecha de modificación		Fecha Mod.	Seguimiento		Nombre completo		Cargo	Tlf. Movil de Contacto
Costo de Inversión	S/ 2,415,514.70	7/02/2025	Responsable del Proyecto		RENE ALVARADO ORTIZ		Subgerente de gestion de inversiones	
Costo de Obra	S/ 1,860,605.87	7/02/2025	Responsable interno de Seguimiento del Proyecto		RENE ALVARADO ORTIZ		Subgerente de gestion de inversiones	
Costo ET	S/ 30,000.00	7/02/2025	Responsable alterno interno de Seguimiento del Proyecto		JENNIFER HUARAC		Economista - SGI	
Item	Actividad	Fecha inicio programada	Fecha inicio real	Duración (días)	Fecha fin programada	Fecha fin Real	Responsable Actividad	Área Responsable Actividad
01.00	Formulación	8/01/2025	8/01/2025	7	15/01/2025	15/01/2025		
01.01	Informe solicitando Incorporación al PMI 2025-2027 como inversión. No Previsa	8/01/2025	8/01/2025	2	10/01/2025	10/01/2025	RENE ALVARADO	Subgerencia de gestion de inversiones (SGI)
01.02	Respuesta de OPMI	10/01/2025	10/01/2025	5	15/01/2025	15/01/2025	TATIANA NALDOS	Oficina de Planificación, Presupuesto y Desarrollo Institucional (OPPI)
02.00	Expediente Tecnico	16/04/2025	19/01/2025	157	20/09/2025	25/06/2025		
02.01	Solicitud de Habilitación Presupuestal	16/04/2025	16/04/2025	5	21/04/2025	21/04/2025	RENE ALVARADO	Subgerencia de gestion de inversiones (SGI)
02.02	Requerimiento de Servicio a Abastecimiento	21/04/2025	14/01/2025	6	27/04/2025	26/01/2025	RENE ALVARADO	Subgerencia de gestion de inversiones (SGI)
02.03	Trámite interno de Abastecimiento	27/04/2025	17/01/2025	5	2/05/2025	1/02/2025	SANDRA MAZUELOS	Oficina de Abastecimiento (OA)
02.04	Emisión de OS	2/05/2025	13/01/2025	3	5/05/2025	12/02/2025	SANDRA MAZUELOS	Oficina de Abastecimiento (OA)
02.05	Elaboración de ET (Expediente en 3 entregables)	5/05/2025	19/02/2025		5/05/2025	19/02/2025	RENE ALVARADO	Subgerencia de gestión de inversiones (SGI)
02.06	1er Entregable	6/05/2025	8/02/2025	10	16/05/2025	15/02/2025	CONSULTOR	
02.07	Revisión de 1er entregable	17/05/2025	16/02/2025	7	24/05/2025	24/02/2025	RENE ALVARADO/BENJAMIN CORDOVA	Subgerencia de gestion de inversiones (SGI)/ Subgerencia de obras públicas (SOP)
2.08	Notificación de revisión de 1er entregable	24/05/2025	16/02/2025	1	25/05/2025	17/02/2025	RENE ALVARADO	Subgerencia de gestion de inversiones (SGI)
2.09	Presentación de Levantam. de observación de 1er entreg.	25/05/2025	17/02/2025	9	3/06/2025	6/03/2025	CONSULTOR	
2.1	Revisión de Levant. Observaciones 1er entregable	3/06/2025	8/03/2025	7	10/06/2025	15/03/2025	RENE ALVARADO/BENJAMIN CORDOVA	Subgerencia de gestion de inversiones (SGI)/ Subgerencia de obras públicas (SOP)
2.11	Notificación de revisión de Lev. Obs. 1er entregable	10/06/2025	15/03/2025	1	11/06/2025	15/03/2025	RENE ALVARADO	Subgerencia de gestion de inversiones (SGI)
2.12	Presentación de 2do entregable	6/05/2025	8/02/2025	15	21/05/2025	23/02/2025	CONSULTOR	
2.13	Revisión de 2do entregable	21/05/2025	11/02/2025	12	2/06/2025	7/03/2025	RENE ALVARADO/BENJAMIN CORDOVA	Subgerencia de gestion de inversiones (SGI)/ Subgerencia de obras públicas (SOP)
2.14	Notificación de revisión de 2do entregable	2/06/2025	10/02/2025	1	3/06/2025	11/02/2025	RENE ALVARADO	Subgerencia de gestion de inversiones (SGI)
2.15	Presentación de Lev. Observ. 2do entregable	3/06/2025	8/03/2025	7	10/06/2025	15/03/2025	CONSULTOR	
2.16	Revisión de Lev. Observ. 2do entregable	10/06/2025	15/03/2025	7	17/06/2025	23/03/2025	RENE ALVARADO/BENJAMIN CORDOVA	Subgerencia de gestion de Inversiones (SGI)/ Subgerencia de obras públicas (SOP)
2.17	Notificación de Revisión de Lev. Obs. 2do entregable	17/06/2025	21/03/2025	1	18/06/2025	15/03/2025	RENE ALVARADO	Subgerencia de gestion de inversiones (SGI)
2.18	Presentación de 3er entregable	19/06/2025	24/03/2025	20	9/07/2025	13/04/2025	CONSULTOR	
2.19	Revisión de 3er entregable	9/07/2025	13/04/2025	12	21/07/2025	25/04/2025	RENE ALVARADO/BENJAMIN CORDOVA	Subgerencia de gestion de Inversiones (SGI)/ Subgerencia de obras públicas (SOP)
2.2	Notificación de revisión de 3er entregable	21/07/2025	25/04/2025	1	22/07/2025	26/04/2025	RENE ALVARADO	Subgerencia de gestion de inversiones (SGI)
2.21	Presentación de Lev. Observ. 3er entregable	22/07/2025	26/04/2025	7	29/07/2025	1/05/2025	CONSULTOR	
2.22	Revisión de Lev. Observ. 3er entregable	29/07/2025	3/05/2025	7	5/08/2025	10/05/2025	RENE ALVARADO/BENJAMIN CORDOVA	Subgerencia de gestion de inversiones (SGI)/ Subgerencia de obras públicas (SOP)
2.23	Notificación de Revisión de Lev. Obs. 3er entregable	5/08/2025	10/05/2025	1	6/08/2025	11/05/2025	RENE ALVARADO	Subgerencia de gestion de inversiones (SGI)
2.24	Presentación de Expediente completo (2 originales)	6/08/2025	11/05/2025	5	11/08/2025	16/05/2025	CONSULTOR	
2.25	Informe de Consistencia	11/08/2025	16/05/2025	2	13/08/2025	18/05/2025	RENE ALVARADO	Subgerencia de gestion de inversiones (SGI)
2.26	Pase a GDU para Aprobación con RG	13/08/2025	18/05/2025	1	14/08/2025	19/05/2025	PATRICIA SANTANA	Gerencia de Desarrollo Urbano (GDU)
2.27	Aprobación de GDU con RG	14/08/2025	19/05/2025	3	17/08/2025	22/05/2025	PATRICIA SANTANA	Gerencia de Desarrollo Urbano (GDU)
2.28	Derivación de Expediente Técnico a SOP	17/08/2025	22/05/2025	1	18/08/2025	23/05/2025	RENE ALVARADO	Subgerencia de gestion de inversiones (SGI)

03.00 Acciones Preparatorias	21/09/2025	26/06/2025	18	9/10/2025	14/07/2025		
03.01 UO a OGPDI (Solicitud habilitación optal)	21/09/2025	26/06/2025	1	22/09/2025	27/06/2025	BENJAMIN CORDOVA	Subgerencia de obras públicas (SOP)
	22/09/2025	27/06/2025	2	24/09/2025	29/06/2025	TATIANA NALDOS	Oficina General de Planeamiento, presupuesto y desarrollo institucional (OPPI)
03.02 OGPDI a UO (habilita recursos)							
UO a OA (Requerimiento de Ejecución de Obra - a	24/09/2025	29/06/2025	3	27/09/2025	2/07/2025		
03.03 Abastecimiento)						BENJAMIN CORDOVA	Subgerencia de obras públicas (SOP)
03.04 OA/OGAF/UO (Conformación de Comité de Selección)	27/09/2025	2/07/2025	2	29/09/2025	4/07/2025	SANDRA MAZUELOS	Oficina de Abastecimiento (OA)
	29/09/2025	4/07/2025	10	9/10/2025	14/07/2025		
03.05 OGAF a OA (Elaboración de Expediente de Contratación)						SANDRA MAZUELOS	Oficina de Abastecimiento (OA)
04.00 Proceso de Selección	10/10/2025	15/07/2025	30	9/11/2025	14/08/2025		
04.01 Convocatoria	10/10/2025	15/07/2025	1	11/10/2025	16/07/2025	SANDRA MAZUELOS	Oficina de Abastecimiento (OA)
04.02 Registro de participantes	11/10/2025	16/07/2025	3	14/10/2025	19/07/2025	SANDRA MAZUELOS	Oficina de Abastecimiento (OA)
04.03 Formulación de consultas	14/10/2025	19/07/2025	2	16/10/2025	21/07/2025	SANDRA MAZUELOS	Oficina de Abastecimiento (OA)
04.04 Absolución de consultas y observaciones	16/10/2025	21/07/2025	3	19/10/2025	24/07/2025	SANDRA MAZUELOS	Oficina de Abastecimiento (OA)
04.05 Integración de bases	19/10/2025	24/07/2025	1	20/10/2025	25/07/2025	SANDRA MAZUELOS	Oficina de Abastecimiento (OA)
04.06 Presentación de ofertas	20/10/2025	25/07/2025	2	22/10/2025	27/07/2025	SANDRA MAZUELOS	Oficina de Abastecimiento (OA)
04.07 Evaluación y calificación	22/10/2025	27/07/2025	4	26/10/2025	31/07/2025	SANDRA MAZUELOS	Oficina de Abastecimiento (OA)
04.08 Otorgamiento de la buena pro	26/10/2025	31/07/2025	1	27/10/2025	1/08/2025	SANDRA MAZUELOS	Oficina de Abastecimiento (OA)
04.09 Consentimiento del otorgamiento de la buena pro	27/10/2025	1/08/2025	5 dh	1/11/2025	6/08/2025	SANDRA MAZUELOS	Oficina de Abastecimiento (OA)
04.10 Requisitos para perfeccionar el contrato	1/11/2025	6/08/2025	7 dh	8/11/2025	13/08/2025	SANDRA MAZUELOS	Oficina de Abastecimiento (OA)
04.11 Firma de contrato	8/11/2025	13/08/2025	1	9/11/2025	14/08/2025	SANDRA MAZUELOS	Oficina de Abastecimiento (OA)
05.00 Ejecución contractual	10/11/2025	15/08/2025	225	23/06/2026	28/03/2026		
05.01 Solicitud de Adelanto Directo	10/11/2025	15/08/2025	7 dh	17/11/2025	22/08/2025	JULIO CORDOVA	OGA
	17/11/2025	22/08/2025	1	24/11/2025	23/08/2025	BENJAMIN CORDOVA	Subgerencia de obras públicas (SOP)
05.02 Entrega de Terreno	24/11/2025	23/08/2025	1	1/12/2025	24/08/2025	BENJAMIN CORDOVA	Subgerencia de obras públicas (SOP)
05.03 Remisión de expediente completo	1/12/2025	24/08/2025	1	8/12/2025	25/08/2025	BENJAMIN CORDOVA	Subgerencia de obras públicas (SOP)
05.04 Presentación de supervisor/ inspector a contratista			1		1/01/1900	BENJAMIN CORDOVA	Subgerencia de obras públicas (SOP)
05.05 Inicio de Obra						CONTRATISTA	CONTRATISTA
05.06 Ejecución de obra	8/12/2025	25/08/2025	210	15/12/2025	23/03/2026	BENJAMIN CORDOVA	Subgerencia de obras públicas (SOP)
05.07 Solicitud de recepción de obra/ conformidad de obra	15/12/2025	23/03/2026	10	22/12/2025	2/04/2026	BENJAMIN CORDOVA	Subgerencia de obras públicas (SOP)
05.08 Recepción de obra	22/12/2025	2/04/2026	1	29/12/2025	3/04/2026	BENJAMIN CORDOVA	Subgerencia de obras públicas (SOP)
06.00 Etapa de liquidación	24/06/2026	29/03/2026	81	13/09/2026	18/06/2026		
06.01 Presentación de Liquidación Contratista	24/06/2026	29/03/2026	60	23/08/2026	28/05/2026	CONTRATISTA / SUPERVISOR	CONTRATISTA / SUPERVISOR
06.02 Revisión de liquidación	23/08/2026	28/05/2026	15	7/09/2026	12/06/2026	BENJAMIN CORDOVA	Subgerencia de obras públicas (SOP)
06.03 Pronunciamiento de Entidad	7/09/2026	12/06/2026	3	10/09/2026	15/06/2026	BENJAMIN CORDOVA	Subgerencia de obras públicas (SOP)
06.04 Consentimiento de Liquidación	10/09/2026	15/06/2026	3	13/09/2026	18/06/2026	BENJAMIN CORDOVA	Subgerencia de obras públicas (SOP)
06.05 Resolución de aprobación de la liquidación	14/09/2026	19/06/2026	2	16/09/2026	21/06/2026	ANGEL HUACCHO	GDSSC
07.00 Etapa de Liquidación de Supervisión	16/12/2025	24/03/2026	126	21/04/2026	28/07/2026		
07.01 Presentación de Liquidación Supervisión	16/12/2025	24/03/2026	60	14/02/2026	23/05/2026	SUPERVISOR	SUPERVISOR
07.02 Revisión de liquidación	14/02/2026	23/05/2026	60	15/04/2026	22/07/2026	BENJAMIN CORDOVA	Subgerencia de obras públicas (SOP)
07.03 Pronunciamiento de Entidad	15/04/2026	22/07/2026	3	18/04/2026	25/07/2026	BENJAMIN CORDOVA	Subgerencia de obras públicas (SOP)
07.04 Consentimiento de Liquidación	18/04/2026	25/07/2026	3	21/04/2026	28/07/2026	BENJAMIN CORDOVA	Subgerencia de obras públicas (SOP)
08.00 Cierre de Proyecto	17/09/2026	22/06/2026	60	16/11/2026	21/08/2026	Responsable UO	
Revisar documentación técnica (preinversión + expediente + 8.01 valorizaciones)	17/09/2026	22/06/2026	20	7/10/2026	12/07/2026	BENJAMIN CORDOVA	Subgerencia de obras públicas (SOP)
8.02 Revisar documentación contable	7/10/2026	12/07/2026	20	27/10/2026	1/08/2026	BENJAMIN CORDOVA	Subgerencia de obras públicas (SOP)
Revisar documentos de pago (exp. Tecnico, supervisión y 8.03 obra)	27/10/2026	1/08/2026	20	16/11/2026	21/08/2026	BENJAMIN CORDOVA	Subgerencia de obras públicas (SOP)
8.04 Resolución de aprobación de Liquidación de obra	16/11/2026	21/08/2026	5	21/11/2026	26/08/2026	BENJAMIN CORDOVA	Subgerencia de obras públicas (SOP)

#SucedaLoQueSuceda





CUI 2678525: "CONSTRUCCION DE SENDERO, CENTRO DE INTERPRETACION, ZONA DE ESTACIONAMIENTO PARA USO TURISTICO Y OFICINA Y/O CASETA DE INFORMACION TURISTICA; EN EL(LA) HUACA MELGAREJO DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA"

Item	Actividad	Fecha inicio programada	Fecha inicio real	Duración (días)	Fecha fin programada	Fecha fin real	Responsable Actividad	Área Responsable Actividad
01.00	Formulación	8/01/2025	8/01/2025	2	15/01/2025	15/01/2025		
01.01	Informe solicitando Incorporación al PMI 2025-2027 como Inversión. No Prevista	8/01/2025	8/01/2025	7	10/01/2025	10/01/2025	RENE ALVARADO	Subgerencia de gestion de inversiones (SGI)
01.02	Respuesta de OPMI	10/01/2025	10/01/2025	5	15/01/2025	15/01/2025	TATIANA NALDOS	Oficina de Planificación, Presupuesto y Desarrollo Institucional (OPDDI)
02.00	Expediente Técnico							
02.01	Solicitud de Habilitación Presupuestal	16/04/2025	16/04/2025	5	21/04/2025	21/04/2025	RENE ALVARADO	Subgerencia de gestion de inversiones (SGI)
02.02	Requerimiento de Servicio a Abastecimiento	21/04/2025	21/04/2025	6	27/04/2025	27/04/2025	RENE ALVARADO	Subgerencia de gestion de inversiones (SGI)
02.03	Trámite interno de Abastecimiento	27/04/2025	27/04/2025	5	2/05/2025	02/05/2025	SANDRA MAZUELOS	Oficina de Abastecimiento (OA)
02.04	Emisión de OS	2/05/2025	2/05/2025	3	5/05/2025	05/05/2025	SANDRA MAZUELOS	Oficina de Abastecimiento (OA)
02.05	Elaboración de ET (Expediente en 3 entregables)	5/05/2025	5/05/2025		5/05/2025	05/05/2025	RENE ALVARADO	Subgerencia de gestion de inversiones (SGI)
02.06	1er Entregable	6/05/2025	6/05/2025	10	16/05/2025	16/05/2025	CONSULTOR	CONSULTOR
02.07	Revisión de 1er entregable	17/05/2025	17/05/2025	7	24/05/2025	24/05/2025	RENE ALVARADO/BENJAMIN CORDOVA	Subgerencia de gestión de inversiones (SGI)/ Subgerencia de obras públicas (SOP)
2.08	Notificación de revisión de 1er entregable	24/05/2025	24/05/2025	1	25/05/2025	25/05/2025	RENE ALVARADO	Subgerencia de gestion de inversiones (SGI)
2.09	Presentación de Levantam. de observación de 1er entreg.	25/05/2025	25/05/2025	9	3/06/2025	03/06/2025	CONSULTOR	CONSULTOR
2.1	Revisión de Levant. Observaciones 1er entregable	3/06/2025	3/06/2025	7	10/06/2025	10/06/2025	RENE ALVARADO/BENJAMIN CORDOVA	Subgerencia de gestion de inversiones (SGI)/ Subgerencia de obras públicas (SOP)
2.11	Notificación de revisión de Lev. Obs. 1er entregable	10/06/2025	10/06/2025	1	11/06/2025	11/06/2025	RENE ALVARADO	Subgerencia de gestion de inversiones (SGI)
2.12	Presentación de 2do entregable	6/05/2025	6/05/2025	15	21/05/2025	21/05/2025	CONSULTOR	CONSULTOR
2.13	Revisión de 2do entregable	21/05/2025	21/05/2025	12	2/06/2025	14/06/2025	RENE ALVARADO/BENJAMIN CORDOVA	Subgerencia de gestión de inversiones (SGI)/ Subgerencia de obras públicas (SOP)
2.14	Notificación de revisión de 2do entregable	2/06/2025	2/06/2025	1	3/06/2025	03/06/2025	RENE ALVARADO	Subgerencia de gestion de inversiones (SGI)
2.15	Presentación de Lev. Observ. 2do entregable	3/06/2025	3/06/2025	7	10/06/2025	10/06/2025	CONSULTOR	CONSULTOR
2.16	Revisión de Lev. Observ. 2do entregable	10/06/2025	10/06/2025	7	17/06/2025	17/06/2025	RENE ALVARADO/BENJAMIN CORDOVA	Subgerencia de gestion de inversiones (SGI)/ Subgerencia de obras públicas (SOP)
2.17	Notificación de Revisión de Lev. Obs. 2do entregable	17/06/2025	17/06/2025	1	18/06/2025	18/06/2025	RENE ALVARADO	Subgerencia de gestion de inversiones (SGI)
2.18	Presentación de 3er entregable	19/06/2025	19/06/2025	20	9/07/2025	09/07/2025	CONSULTOR	CONSULTOR
2.19	Revisión de 3er entregable	9/07/2025	9/07/2025	12	21/07/2025	21/07/2025	RENE ALVARADO/BENJAMIN CORDOVA	Subgerencia de gestion de inversiones (SGI)/ Subgerencia de obras públicas (SOP)
2.2	Notificación de revisión de 3er entregable	21/07/2025	21/07/2025	1	22/07/2025	22/07/2025	RENE ALVARADO	Subgerencia de gestion de inversiones (SGI)
2.21	Presentación de Lev. Observ. 3er entregable	22/07/2025	22/07/2025	7	29/07/2025	29/07/2025	CONSULTOR	CONSULTOR
2.22	Revisión de Lev. Observ. 3er entregable	29/07/2025	29/07/2025	7	5/08/2025	05/08/2025	RENE ALVARADO/BENJAMIN CORDOVA	Subgerencia de gestion de inversiones (SGI)/ Subgerencia de obras públicas (SOP)
2.23	Notificación de Revisión de Lev. Obs. 3er entregable	5/08/2025	5/08/2025	1	6/08/2025	06/08/2025	RENE ALVARADO	Subgerencia de gestion de inversiones (SGI)
2.24	Presentación de Expediente completo (2 originales)	6/08/2025	6/08/2025	5	11/08/2025	11/08/2025	CONSULTOR	CONSULTOR
2.25	Informe de Consistencia	11/08/2025	11/08/2025	2	13/08/2025	13/08/2025	RENE ALVARADO	Subgerencia de gestion de inversiones (SGI)
2.26	Pase a GDU para Aprobación con RG	13/08/2025	13/08/2025	1	14/08/2025	14/08/2025	PATRICIA SANTANA	Gerencia de Desarrollo Urbano (GDU)
2.27	Aprobación de GDU con RG	14/08/2025	14/08/2025	3	17/08/2025	17/08/2025	PATRICIA SANTANA	Gerencia de Desarrollo Urbano (GDU)
2.28	Derivación de Expediente Técnico a SOP	17/08/2025	17/08/2025	1	18/08/2025	18/08/2025	RENE ALVARADO	Subgerencia de gestión de inversiones (SGI)

Item	Actividad	Fecha inicio programada	Fecha inicio real	Duración (días)	Fecha fin programada	Fecha fin real	Responsable Actividad	Área Responsable Actividad
03.00	Acciones Preparatorias	21/09/2025	26/06/2025	18	9/10/2025	14/07/2025		
03.01	UO a OGPPDI (Solicitud habilitación pptal)	21/09/2025	26/06/2025	1	22/09/2025	27/06/2025	BENJAMIN CORDOVA	Subgerencia de obras publicas (SOP)
03.02	OGPPDI a UO (habilita recursos)	22/09/2025	27/06/2025	2	24/09/2025	29/06/2025	TATIANA NALDOS	Oficina General de Planeamiento, presupuesto y desarrollo institucional (OPDDI)
03.03	UO a OA (Requerimiento de Ejecución de Obra - a Abastecimiento)	24/09/2025	29/06/2025	3	27/09/2025	2/07/2025	BENJAMIN CORDOVA	Subgerencia de obras publicas (SOP)
03.04	OA/OGAF/UO (Conformación de Comité de Selección)	27/09/2025	2/07/2025	2	29/09/2025	4/07/2025	SANDRA MAZUELOS	Oficina de Abastecimiento (OA)
03.05	OGAF a OA (Elaboración de Expediente de Contratación)	29/09/2025	4/07/2025	10	9/10/2025	14/07/2025	SANDRA MAZUELOS	Oficina de Abastecimiento (OA)
04.00	Proceso de Selección	10/10/2025	15/07/2025	30	9/11/2025	14/08/2025		
04.01	Convocatoria	10/10/2025	15/07/2025	1	11/10/2025	16/07/2025	SANDRA MAZUELOS	Oficina de Abastecimiento (OA)
04.02	Registro de participantes	11/10/2025	16/07/2025	3	14/10/2025	19/07/2025	SANDRA MAZUELOS	Oficina de Abastecimiento (OA)
04.03	Formulación de consultas	14/10/2025	19/07/2025	2	16/10/2025	21/07/2025	SANDRA MAZUELOS	Oficina de Abastecimiento (OA)
04.04	Absolución de consultas y observaciones	16/10/2025	21/07/2025	3	19/10/2025	24/07/2025	SANDRA MAZUELOS	Oficina de Abastecimiento (OA)
04.05	Integración de bases	19/10/2025	24/07/2025	1	20/10/2025	25/07/2025	SANDRA MAZUELOS	Oficina de Abastecimiento (OA)
04.06	Presentación de ofertas	20/10/2025	25/07/2025	2	22/10/2025	27/07/2025	SANDRA MAZUELOS	Oficina de Abastecimiento (OA)
04.07	Evaluación y calificación	22/10/2025	27/07/2025	4	26/10/2025	31/07/2025	SANDRA MAZUELOS	Oficina de Abastecimiento (OA)
04.08	Otorgamiento de la buena pro	26/10/2025	31/07/2025	1	27/10/2025	1/08/2025	SANDRA MAZUELOS	Oficina de Abastecimiento (OA)
04.09	Consentimiento del otorgamiento de la buena pro	27/10/2025	1/08/2025	5 dh	1/11/2025	6/08/2025	SANDRA MAZUELOS	Oficina de Abastecimiento (OA)
04.10	Requisitos para perfeccionar el contrato	1/11/2025	6/08/2025	7 dh	8/11/2025	13/08/2025	SANDRA MAZUELOS	Oficina de Abastecimiento (OA)
04.11	Firma de contrato	8/11/2025	13/08/2025	1	9/11/2025	14/08/2025	SANDRA MAZUELOS	Oficina de Abastecimiento (OA)
05.00	Ejecución contractual	10/11/2025	15/08/2025	225	23/06/2026	28/03/2026		
05.01	Solicitud de Adelanto Directo	10/11/2025	15/08/2025	7 dh	17/11/2025	22/08/2025	JULIO CORDOVA	OGA
05.02	Entrega de Terreno	17/11/2025	22/08/2025	1	24/11/2025	23/08/2025	BENJAMIN CORDOVA	Subgerencia de obras públicas (SOP)
05.03	Remisión de expediente completo	24/11/2025	23/08/2025	1	1/12/2025	24/08/2025	BENJAMIN CORDOVA	Subgerencia de obras públicas (SOP)
05.04	Presentación de supervisor/ inspector a contratista	1/12/2025	24/08/2025	1	8/12/2025	25/08/2025	BENJAMIN CORDOVA	Subgerencia de obras públicas (SOP)
05.05	Inicio de Obra			1		1/01/1900	BENJAMIN CORDOVA	Subgerencia de obras públicas (SOP)
05.06	Ejecución de obra	8/12/2025	25/08/2025	210	15/12/2025	23/03/2026	CONTRATISTA	CONTRATISTA
05.07	Solicitud de recepción de obra/ conformidad de obra	15/12/2025	23/03/2026	10	22/12/2025	2/04/2026	BENJAMIN CORDOVA	Subgerencia de obras públicas (SOP)
05.08	Recepción de obra	22/12/2025	2/04/2026	1	29/12/2025	3/04/2026	BENJAMIN CORDOVA	Subgerencia de obras públicas (SOP)
06.00	Etapas de liquidación	24/06/2026	29/03/2026	81	13/09/2026	18/06/2026		
06.01	Presentación de Liquidación Contratista	24/06/2026	29/03/2026	60	23/08/2026	28/05/2026	CONTRATISTA / SUPERVISOR	CONTRATISTA / SUPERVISOR
06.02	Revisión de liquidación	23/08/2026	28/05/2026	15	7/09/2026	12/06/2026	BENJAMIN CORDOVA	Subgerencia de obras publicas (SOP)
06.03	Pronunciamento de Entidad	7/09/2026	12/06/2026	3	10/09/2026	15/06/2026	BENJAMIN CORDOVA	Subgerencia de obras publicas (SOP)
06.04	Consentimiento de Liquidación	10/09/2026	15/06/2026	3	13/09/2026	18/06/2026	BENJAMIN CORDOVA	Subgerencia de obras publicas (SOP)
06.05	Resolución de aprobación de la liquidación	14/09/2026	19/06/2026	2	16/09/2026	21/06/2026	ANGEL HUACCHO	GDSSC
07.00	Etapas de Liquidación de Supervisión	16/12/2025	24/03/2026	126	21/04/2026	28/07/2026		
07.01	Presentación de Liquidación Supervisión	16/12/2025	24/03/2026	60	14/02/2026	23/05/2026	SUPERVISOR	SUPERVISOR
07.02	Revisión de liquidación	14/02/2026	23/05/2026	60	15/04/2026	22/07/2026	BENJAMIN CORDOVA	Subgerencia de obras publicas (SOP)
07.03	Pronunciamento de Entidad	15/04/2026	22/07/2026	3	18/04/2026	25/07/2026	BENJAMIN CORDOVA	Subgerencia de obras publicas (SOP)
07.04	Consentimiento de Liquidación	18/04/2026	25/07/2026	3	21/04/2026	28/07/2026	BENJAMIN CORDOVA	Subgerencia de obras publicas (SOP)
08.00	Cierre de Proyecto	17/09/2026	22/06/2026	60	16/11/2026	21/08/2026	Responsable UO	
8.01 +	Revisar documentación técnica (preinversión + expediente + valorizaciones)	17/09/2026	22/06/2026	20	7/10/2026	12/07/2026	BENJAMIN CORDOVA	Subgerencia de obras publicas (SOP)
8.02	Revisar documentación contable	7/10/2026	12/07/2026	20	27/10/2026	1/08/2026	BENJAMIN CORDOVA	Subgerencia de obras publicas (SOP)
8.03	Revisar documentos de pago (exp. Técnico, supervisión y obra)	27/10/2026	1/08/2026	20	16/11/2026	21/08/2026	BENJAMIN CORDOVA	Subgerencia de obras publicas (SOP)
8.04	Resolución de aprobación de Liquidación de obra	16/11/2026	21/08/2026	5	21/11/2026	26/08/2026	BENJAMIN CORDOVA	Subgerencia de obras publicas (SOP)

#SucedaLoQueSuceda




¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!



Municipalidad de
La Molina

LA MOLINA
Se Renueva



Municipalidad de
La Molina

ESTADO SITUACIONAL

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS



Municipalidad de
La Molina

LA MOLINA
Se Renueva



INVERSIONES PRIORIZADAS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO; REMODELACION DE VEREDA; ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS Y GIMNASIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARQUE MANUEL SCORZA, URB. SANTA RAQUEL - ZONA 1- SECTOR 2, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” CUI N° 2588016

OBRA CULMINADA

TRABAJOS REALIZADOS:

1. VEREDA: 16.55 M2
2. VEREDA DE ADOQUIN: 176.85 M2
3. PISO DE BALDOSAS DE CAUCHO: 70.88 M2
4. PISO DE PIEDRA CONFITILLO: 25.46 M2
5. REPARACION DE REJAS: 188.35 ML
6. MOBILIARIO JUEGOS INFANTILES Y MINIGIMNASIO: 2 UND
7. PERGOLA: 3 UND





ANTES



#SucedaLoQueSuceda

LA MOLINA
Se Renueva



DESPUES



#SucedaLoQueSuceda

LA MOLINA
Se Renueva



PROYECTOS CONSIDERADOS PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

“RENOVACION DE PISTA; CONSTRUCCION DE VEREDA; EN EL(LA) ASOC. APROVISA LA MOLINA SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” CUI N° 2578084.

OBRA CULMINADA

TRABAJOS REALIZADOS:

1. PARCHADO DE PISTA: 69.35 M2
2. RECAPEO DE PISTA: 2,040.00 M2
3. VEREDA: 321.27 M2
4. RAMPA: 273.00 M2
5. PISO DE ADOQUIN: 682.50 M2
6. PINTADO DE SEÑALIZACION: 1,597.06 ML

AREA DE INTERVENCION





ANTES



#SucedaLoQueSuceda

LA MOLINA
Se Renueva



DESPUES



#SucedaLoQueSuceda


LA MOLINA
Se Renueva

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!



Municipalidad de
La Molina

LA MOLINA
Se Renueva



Municipalidad de
La Molina

ESTADO SITUACIONAL

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES



Municipalidad de
La Molina

LA MOLINA
Se Renueva



TALLER RENDICIÓN DE CUENTAS – PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES *SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES*

1. ADQUISICIÓN DE UNIDAD MULTIPROPÓSITO CON EQUIPAMIENTO DE RESCATE EN LA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE LA MOLINA N°96 - DISTRITO DE LA MOLINA

CUI: 2655847

MONTO APROBADO PP 2023: S/ 1,100,000.00

#SucedaLoQueSuceda

LA MOLINA
Se Renueva



TALLER RENDICIÓN DE CUENTAS – PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

1. ADQUISICIÓN DE UNIDAD MULTIPROPÓSITO CON EQUIPAMIENTO DE RESCATE EN LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE LA MOLINA N°96 - DISTRITO DE LA MOLINA

La Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, encargada de la Unidad Ejecutora de Inversiones efectuó la aprobación del estudio definitivo de la IOARR con CUI – 2655847 y la ejecución de la etapa I correspondiente a la ADQUISICIÓN DE UNIDAD MULTIPROPÓSITO CON EQUIPAMIENTO DE RESCATE.

A la fecha, la Oficina de Abastecimiento viene desarrollando el proceso de contratación para la ejecución física de esta inversión contando con la información necesaria para iniciar los actos preparatorios como parte del proceso de contratación para la adquisición de esta unidad.

OBJETIVO: Que el distrito de la La Molina disponga de una unidad vehicular multipropósito debidamente equipada para la atención de emergencias, mediante la cesión de uso a la Compañía de Bomberos N°96, optimizando recursos y potenciando la capacidad de respuesta ante incidentes.



TALLER RENDICIÓN DE CUENTAS – PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Unidad vehicular:

Imágenes referenciales



#SucedaLoQueSuceda

LA MOLINA
Se Renueva

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!



Municipalidad de
La Molina

LA MOLINA
Se Renueva
